



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИВАНОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

Электросетевой комплекс
КТП-256 СНТ «Южный»
(Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Жуково)

Составил: _____



С.А. Пшеничников

Проверил: _____

С.А. Корычев

Паспорт составлен «01» апреля 2026 г.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Наименование	КТП-256 СНТ «Южный» 100 кВА 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ	
Дата ввода в эксплуатацию	1972	
Балансовая принадлежность	ООО «ИВЭЛС» (ИНН: 3702171348)	
Основной потребитель	СНТ «Южный», СНТ «Юбилейный»	
Показатели надежности потребителя	третья категория	
Сезонность потребителя	всесезонное потребление	
Питающая линия	Основная	ВЛ-6 кВ ф. 653 ПС «Жуково»
	Резервная	


ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Зав.№ тр-ра	Тип	Мощность	Группа соедин.	ВН	НН	Uк %	ПБВ	Год выпуска
44847	ТМ-100/6-66У1	100 кВА	У/Ун-0	6 кВ	0,4кВ	4,7	± 2х2,5%	1972

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

№	Наименование электрооборудования	Протяженность, м	Эксплуатационная ответственность
ВЛ-6 кВ			
1	ВЛ-6 кВ от оп. №12 ф. 653 ПС «Жуково» до КТП-256 «Южный»	100 м	ООО «ИВЭЛС»
ВЛ-0,4 кВ			
1	ВЛ-0,4 кВ от КТП-256 до садовых участков СНТ "Южный"	600 м	ООО «ИВЭЛС»
2	ВЛ-0,4 кВ от КТП-256 до садовых участков СНТ "Юбилейный"	2050 м	ООО «ИВЭЛС»

Однолинейная схема

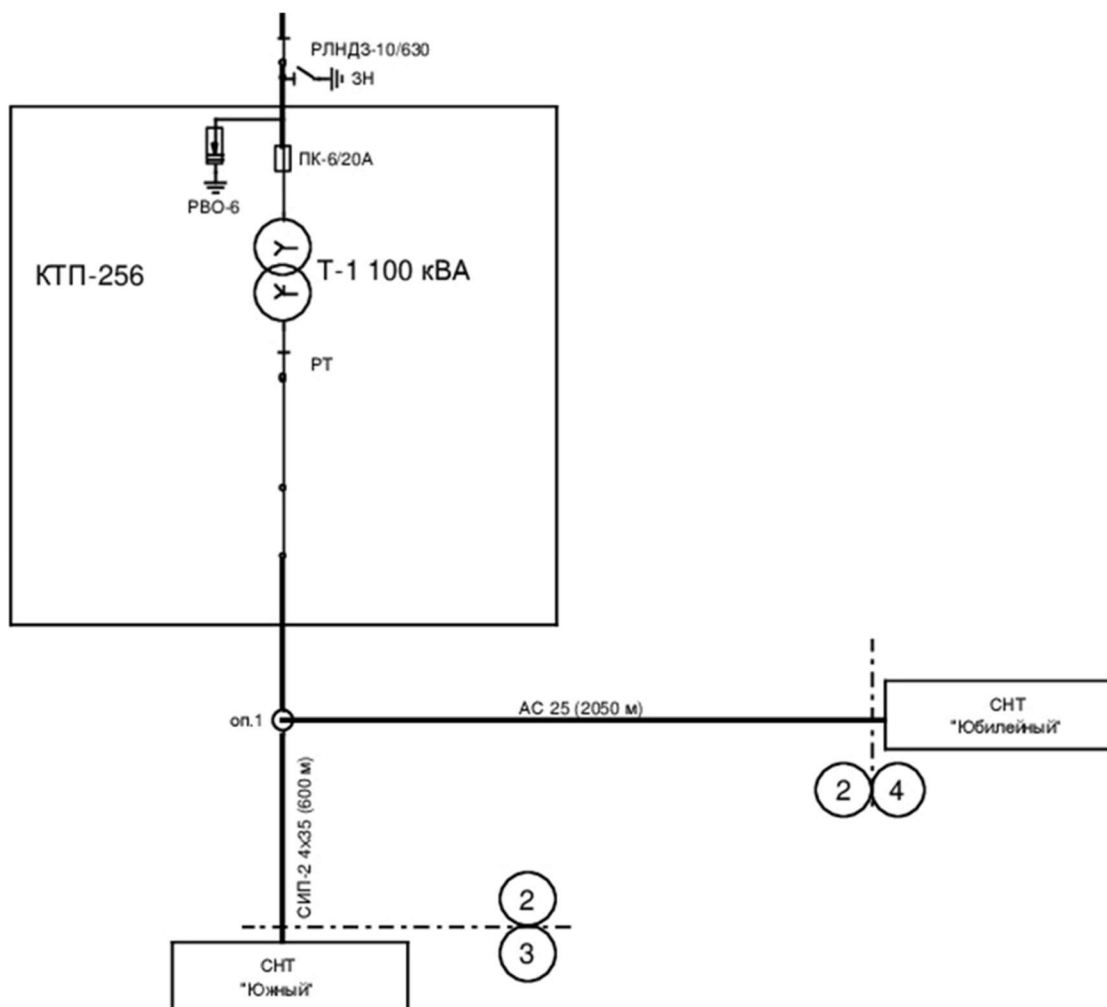

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

Дата	Описание работ	Должность, фамилия и подпись производителя работ
01.04.20 26	Техническое обслуживание силового трансформатора: осмотр бака, вводов и уплотнений, проверка уровня масла, очистка вводов; обслуживание ПБВ с переключением по всем положениям и возвратом в рабочее положение.	Ответственный за производство работ: 

Дата	Описание работ	Должность, фамилия и подпись производителя работ

Дата	Описание работ	Должность, фамилия и подпись производителя работ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИЯХ И ИЗМЕРЕНИЯХ

№	Дата	Наименование оборудования	Результат	Примечание
1	2	3	4	5
1	01.04.2026	Силовой трансформатор и ошиновка КТП	Измерено сопротивление изоляции обмоток и ошиновки. Значения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции соответствуют установленным требованиям.	Испытание выдержано. Оборудование допущено к эксплуатации.
2	01.04.2026	Контур заземления и металлосвязь	Измерено сопротивление заземляющего устройства, проверена непрерывность защитных проводников и металлосвязь оборудования с контуром. Результаты соответствуют требованиям.	Заземляющее устройство исправно.
3	01.04.2026	Силовой трансформатор	Проверены коэффициент трансформации, группа соединения и сопротивление обмоток постоянному току. Отклонения не превышают допустимых значений.	Результаты удовлетворительные.
4	01.04.2026	РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ	Измерено сопротивление изоляции, проверены коммутационные аппараты, механические блокировки и затяжка контактных соединений. Неисправностей, препятствующих эксплуатации, не выявлено.	Допущено к эксплуатации.
5	01.04.2026	Силовой трансформатор — техническое диагностирование	Выполнены внешний осмотр и оценка технического состояния. Установлены значительный физический износ и снижение эксплуатационной надежности оборудования.	Ограниченно работоспособен. Рекомендована плановая замена трансформатора.

№	Дата	Наименование оборудования	Результат	Примечание
1	2	3	4	5
